



# บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 รับเลขที่ 1984  
 วันที่ 21 มี.ย. 2563  
 เวลา 13-39 5'

ส่วนราชการ กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร. IP-PHONE ๑๔๒

ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑(๑)/๑๑๔๙ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอนำส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

### เรื่องเดิม

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมและประสานงานต่าง ๆ ในการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย นั้น

### ข้อเท็จจริง

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการไปเป็นด้วยความเรียบร้อย งานอาคารสถานที่ฯ จึงขอนำส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปิตา โทณลิมา)

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

13/๖ ๕๕๖๖  
 สกลนคร  
 1/๑๑๖ ๕๕๖๖  
 อว.สว. 1๓๖๖

- เรียน  อธิการบดี
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- ผอ. สำนักงานอธิการบดี

ที่ประชุม  
 1/๑๑๖ ๕๕๖๖  
 ๓๖๖

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิษณุดา ธานี)  
 ผู้อำนวยการกองกลาง ๑๓๖๖

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

1/๑๑๖ ๕๕๖๖  
 ๓๖๖  
 ๑๓๖๖

(นายเกษม บุตรดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี "อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร"

- ทน  
 - ๑๓๖๖/๑๓๖๖  
 ๑๓๖๖  
 ๑๓๖๖  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ขาญชิดปรีชา)  
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


JHV(๕)



สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โครงการก่อสร้างภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สัญญาครั้งที่	ลงวันที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะ เวลา(วัน)	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว(วัน)	เหลือ เวลา(วัน)	ก้าวหน้า แล้ว (%)	ก้าวหน้า จริง (%)	ความก้าวหน้าเทียบกับแผน		ค่าตัว แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
												เงิน (%)	ค่า (%)		
<b>งบแผ่นดิน</b>															
1	ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นบน 1 ชั้น		16/2563	9/4/2563	17/6/2563	15/6/2563	60	479,000	44	16	72.52	75.00		48.35	
2	ก่อสร้างโถงโถงบันไดทางขึ้นอาคารหอสมุดเก่า ชั้นบน 1 ชั้น		13/2563	25/3/2563	31/3/2563	28/3/2563	90	370,000	61	29	67.78	65.00		32.78	
3	ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปลูกไม้พุ่มหน้าห้องโถงชั้นบน) อาคาร ชั้นบน 1 ชั้น		11/2563	9/4/2563	14/6/2563	12/7/2563	90	984,500	87	43	52.22	35.96		17.22	
4	ก่อสร้างรั้วรอบขอบชิดเชิงทิศใต้ ชั้นบน 1 ชั้น		14/2563	19/3/2563	23/3/2563	20/3/2563	90	800,000	69	21	76.87	62.00		14.67	
5	ก่อสร้างประตูทางออก ชั้นบน 1 ชั้น		12/2563	2/4/2563	7/4/2563	5/7/2563	90	870,000	54	36	60.00	40.00			
6	ปรับปรุงอาคาร สโมสรชม 1, 2 ชั้นบน 1 ชั้น		17/2563	30/4/2563	30/4/2563	26/9/2563	150	1,740,000	31	119	20.67	5.00		15.67	
7	ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นบน 1 ชั้น		22/2563	30/4/2563	30/4/2563	28/7/2563	90	909,545	31	59	34.44	0.00		34.44	
8	ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นบน 1 ชั้น		16/2563	16/4/2563	16/4/2563	25/8/2563	132	909,545	43	87	34.09	0.00		34.09	
9	ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ		20/2563	21/5/2563	21/5/2563	19/8/2563	90	695,000	10	80	11.11	1.50		9.61	
10	ก่อสร้างโถงลิฟต์		23/2563	7/5/2563	7/5/2563	2/11/2563	140	2,140,000	24	136	13.33	1.00		12.33	
11	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		20/2563	21/5/2563	21/5/2563	16/5/2564	360	20,992,015	10	350	2.78	1.00		1.78	
12	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		1/10/26	9/5/2563	9/5/2563	31/10/2563	180	5,240,000	26	154	14.44	5.00		9.44	
13	ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 8 และห้องเรียนปฏิบัติการ อาคารเรียน ศูนย์วิจัย การศึกษา		21/2563	7/5/2563	7/5/2563	3/10/2563	150	2,255,000	24	126	16.00	0.00		16.00	

สรุปเปรียบเทียบความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง

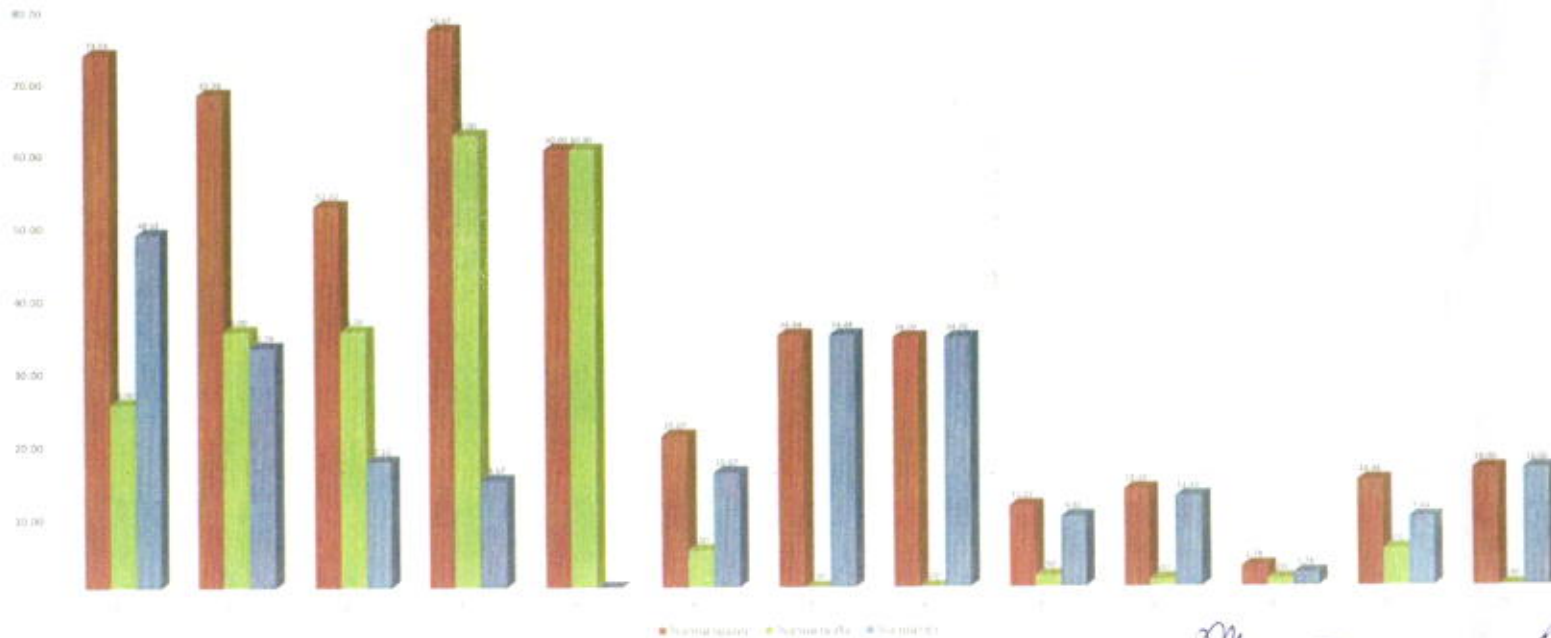

สรุป ณ วันที่ 31/5/2563



คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
วันที่ 31/5/2563

ผู้รายงาน  
นายสมชาย คุ้มสุข  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย การศึกษา

ผู้รับทราบ  
นายวิชาญ วัฒนวิทย์  
ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
