



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รับเลขที่ 3557
 วันที่ 78 ก.ย. 2563
 เวลา 11.30 น.

ส่วนราชการ กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร. IP-PHONE ๑๔๒
 ที่ อว.๐๖๒๓.๐๑(๑)/๑๙๖๓ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
 เรื่อง ขอนำส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่องเดิม

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมและประสานงานต่าง ๆ ในการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย นั้น

ข้อเท็จจริง

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการไปเป็นด้วยความเรียบร้อย งานอาคารสถานที่ฯ จึงขอนำส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปีตา โทณสิมา)

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

- เรียน อธิการบดี
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- ผอ.สำนักงานอธิการบดี

นางสาวพิชญาดา ธานี
 ผู้อำนวยการกองกลาง

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิชญาดา ธานี)
 ผู้อำนวยการกองกลาง

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

- ๑๕๐/๑๓๗
 - ๑๗๗๖๐๐๗๗ (๑๖๐)
 ๓๑-๘-๖๓
 (นายเกษม บุครดี)


ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

(เกษม บุครดี)
 ผอ.กองกลาง
 โทร.๐๙๐-๐๖๓-๖๓๖๐
 ๓๐/๘/๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา)
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

- ๓๖๖/๑๙๖๓
 ๒๖/๘/๖๓


(๑๙๖.๖)
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรีชา ธรรมวินทร)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โครงการก่อสร้างภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สัญญาเลขที่	ลงวันที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะเวลา(วัน)	งบประมาณ(บาท)	ค่าเงินการแล้ว(วัน)	เหลือเวลา(วัน)	ก้าวหน้าแผน (%)	ก้าวหน้าจริง (%)	ความก้าวหน้าเทียบกับแผน		คาดว่าแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
												เร็ว (%)	ช้า (%)		
งบแผ่นดิน															
1	ปรับปรุงอาคารบังเกอร์มห้องสมุดสำหรับผู้พิการ จำนวน 1 งาน	18/2563	9/4/2563	17/4/2563	15/6/2563	60	475,000	136	76	100.00	90.00	-	10.00		หมดสัญญา
2	ปรับปรุงอาคาร คีตกรรม 1, 2 จำนวน 1 งาน	17/2563	30/4/2563	30/4/2563	26/9/2563	150	1,740,000	123	27	82.00	80.00	-	2.00		
3	ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน	16/2563	16/4/2563	16/4/2563	25/8/2563	130	909,545	137	7	100.00	57.00	-	43.00		หมดสัญญา
4	ปรับปรุงลานจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู	24/2563	21/5/2563	21/5/2563	19/8/2563	90	695,000	90	-	100.00	100.00	-	-		เสร็จเรียบร้อยแล้ว
5	ก่อสร้างหอศิลป์	23/2563	7/5/2563	7/5/2563	2/11/2563	180	2,190,000	116	64	64.44	22.00	-	42.44		
6	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์พืชผักอินทรีย์และนวัตกรรม	20/2563	20/5/2563	20/5/2563	16/5/2564	360	20,492,055	103	257	28.61	4.00	-	24.61		
7	ก่อสร้างระบบสาธารณูปการและลานจอดรถ อาคารอนุประสงค์	1/10/06	5/5/2563	5/5/2563	31/10/2563	180	5,240,000	118	62	65.56	45.00	-	20.56		
8	ปรับปรุงหลังคาอาคาร 8 และห้องเรียนปฏิบัติการทางการเงิน คณะวิทยาการจัดการ	21/2563	7/5/2563	7/5/2563	3/10/2563	150	2,255,000	116	34	77.33	72.00	-	5.33		
9	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย จำนวน 1 งาน	26/2563	15/7/2563	18/7/2563	17/9/2563	60	277,000	44	16	73.33	48.00	-	25.33		
10	ก่อสร้างหลังคาห้องออโรจิกวิทยายนต์หอพัก จำนวน 1 งาน	27/2563	19/6/2563	29/6/2563	27/8/2563	60	509,700	63	3	100.00	10.00	-	90.00		หมดสัญญา

กราฟสรุปความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง

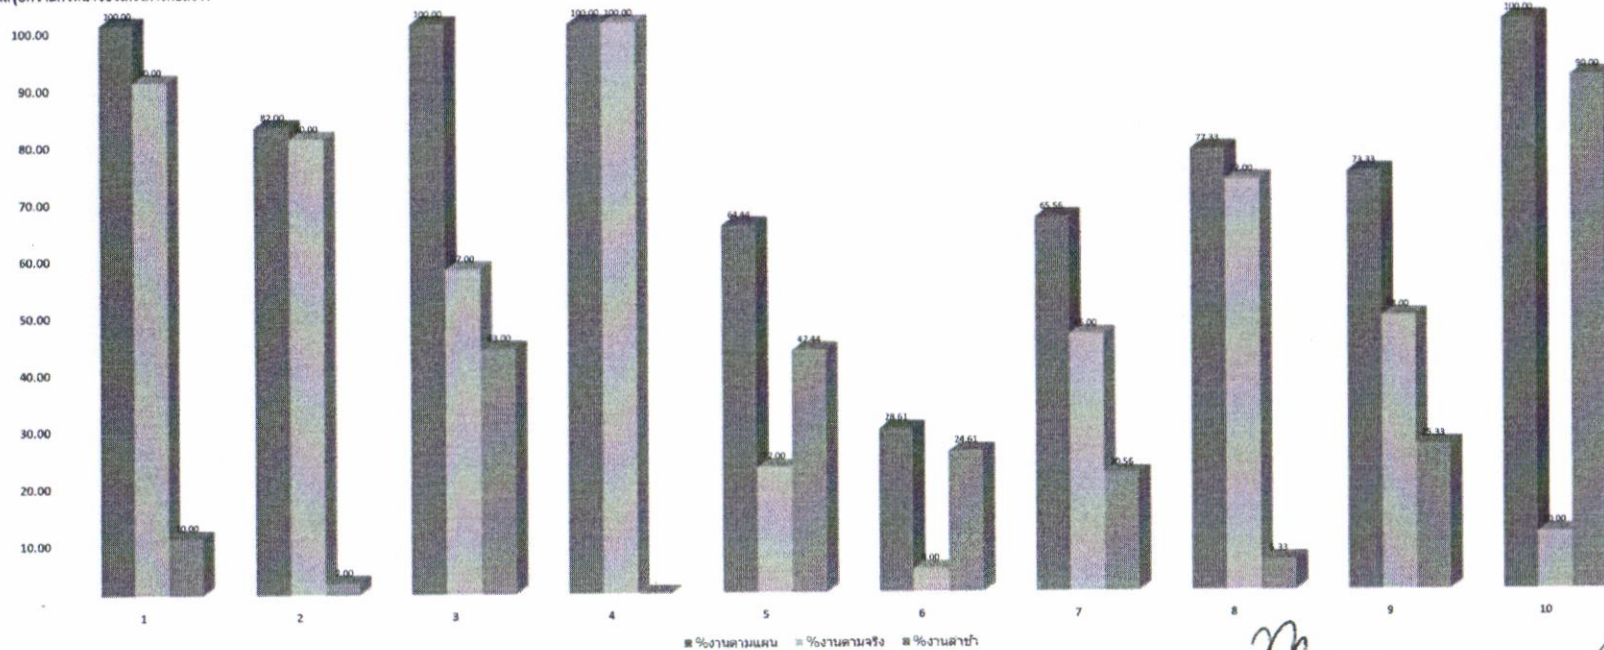

สรุป ณ วันที่
31/8/2563



หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ผู้รายงาน

(Signature)
(นายพงษ์ฤทธิ์ ทูตลา)
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(Signature)
(นายปิตา โทณสินมา)
หัวหน้าหน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
