

รับเลขที่ ๗๗๔
วันที่ 2 มี.ค. 2564
เวลา 11.31 น.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร. IP-PHONE ๑๔๒

ที่ อว.๐๖๒๑.๐๑(๑)/๔๔๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่องเดิม

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมและประสานงานต่าง ๆ ในการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย นั้น

ข้อเท็จจริง

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการไปเป็นด้วยความเรียบร้อย งานอาคารสถานที่ฯ จึงขอนำส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปีตา โทณสิมมา)

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

- เรียน อธิการบดี
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- ผอ.สำนักงานอธิการบดี

Handwritten notes and signatures in the distribution list area.

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิชญาดา ธาณี) ผู้อำนวยการกองกลาง ๑๒๐๖๔

Handwritten signature and notes on the right side of the page.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาณูชิตปรีชา) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
13/03/2024 12:14:50 น. ๑๘๐๖๓๔๒๕๖๔
Handwritten signature and date.

Handwritten signature and name: (ผศ.ปรีชา ชัยวัฒน์)


(นายเกษม บุตรดี) "อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร"
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โครงการก่อสร้างภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สัญญาเลขที่	ลงวันที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะ เวลา(วัน)	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว(วัน)	เหลือ เวลา(วัน)	ก้าวหน้า แผน (%)	ก้าวหน้า จริง (%)	ความก้าวหน้าเทียบกับแผน		คาดว่า แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
												เร็ว (%)	ช้า (%)		
งบแผ่นดิน															
1	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	20/2563	20/5/2563	20/5/2563	16/5/2564	373	20,492,055	284	89	76.14	26.00	-	50.14		ล่าช้าเข้าเกณฑ์ 3 ใน 4
2	ปรับปรุงโรงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	3/2564	24/12/2563	4/1/2564	3/5/2564	120	720,000	55	65	45.83	43.00	-	2.83		
3	ก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการและวิจัยการผลิตสุกร	7/2564	24/12/2563	4/1/2564	2/6/2564	150	1,990,690	55	95	36.67	11.00	-	25.67		
4	ก่อสร้างรั้วรอบหอพักเอราวัณ	9/2564	28/12/2563	6/1/2564	5/5/2564	120	1,125,000	53	67	44.17	16.00	-	28.17		
5	ก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการเกษตร	5/2564	29/1/2564	8/2/2564	7/7/2564	150	1,773,450	20	130	13.33	1.00	-	12.33		
6	ก่อสร้างอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	12/2564	2/2/2564	8/2/2564	7/7/2564	150	1,599,900	20	130	13.33	8.00	-	5.33		
7	ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 คณะครุศาสตร์	15/2564	29/1/2564	4/2/2564	3/6/2564	120	1,724,800	24	96	20.00	6.00	-	14.00		
8	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม	10/2564	12/1/2564	1/2/2564	30/6/2564	150	2,119,000	27	123	18.00	3.00	-	15.00		
9	ปรับปรุงพื้นที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ co-working space	13/2564	19/1/2564	27/1/2564	26/5/2564	120	970,454	32	88	26.67	47.00	20.33	-		

กราฟสรุปความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง

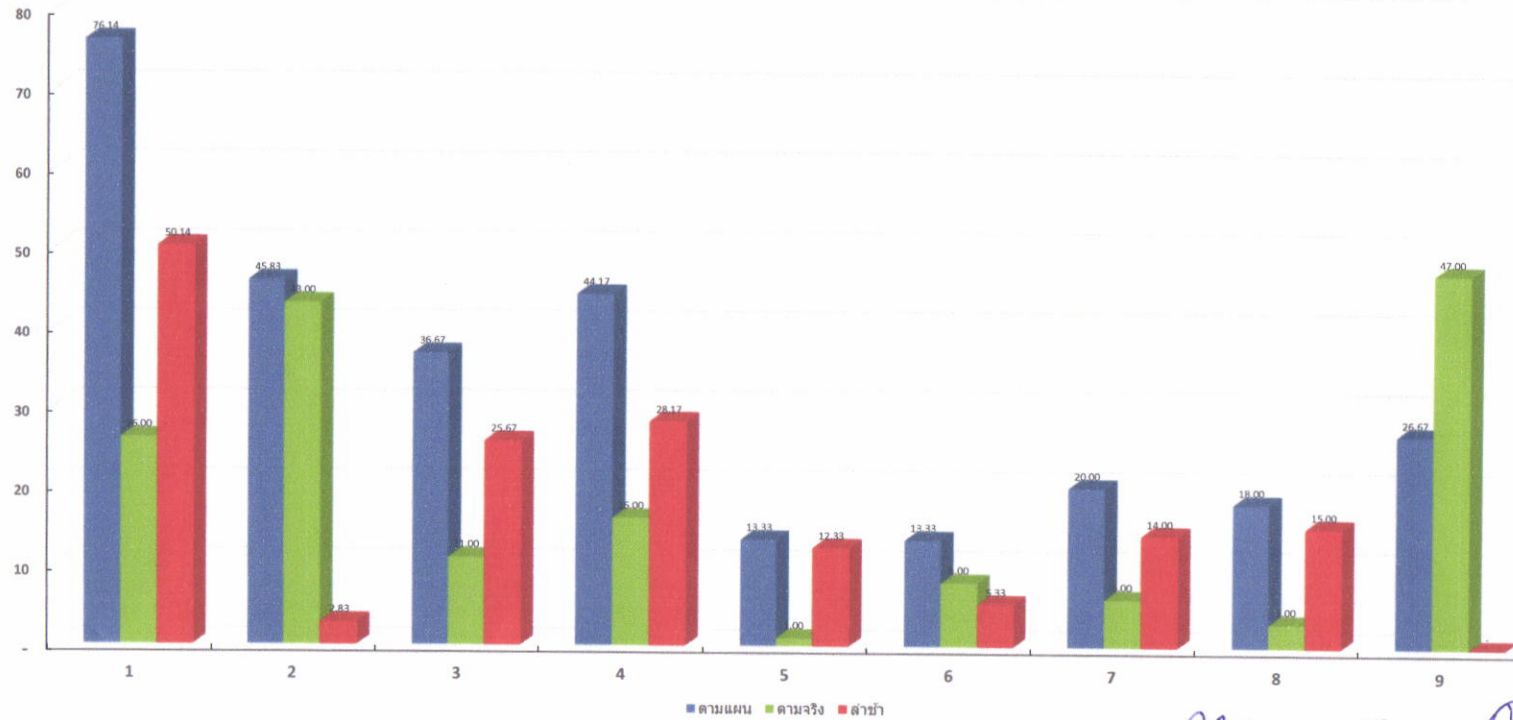

สรุป ณ วันที่
28/2/2564



หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ผู้รายงาน

(นายทรงศักดิ์ หุตธลา)
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายบิศา โทณสินมา)

หัวหน้าหน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
