



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รับเลขที่ 2041
 วันที่ 2 มิ.ย. 2564
 เวลา 15:05 4'

ส่วนราชการ กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร. IP-PHONE ๑๔๒

ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑(๑)/๑๐๖๓ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่องเดิม

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมและประสานงานต่าง ๆ ในการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย นั้น

ข้อเท็จจริง

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการไปเป็นด้วยความเรียบร้อย งานอาคารสถานที่ฯ จึงขอนำส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปีตา โทณสิมมา)

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

1 มิ.ย. 2564

15 มิ.ย. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย ชาติประดิษฐ์)
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

- เรียน อธิการบดี
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 ผอ.สำนักงานอธิการบดี

ปีตา โทณสิมมา
 หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 อว ๐๖๒๑.๐๑(๑)/๑๐๖๓

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิชญาดา ธานี)
 ผู้อำนวยการกองกลาง

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

1 มิ.ย. 2564
 1 มิ.ย. 2564

2 มิ.ย. 64

(นายเกษม บุตรดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

- ทภม

- ณตม/นาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมวินทร์)


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ประจำปี 2564 โครงการก่อสร้างภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สัญญาเลขที่	ลงวันที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้ว (วัน)	เหลือ (วัน)	ก้าวหน้า (%)	จริง (%)	ความก้าวหน้าเทียบกับแผนเร็ว (%)	ช้า (%)	คาดว่าจะแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
งบแผ่นดิน															
1	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทรงพระเจริญรัชชกาลที่ 9	20/2563	20/5/2563	20/5/2563	16/5/2564	373	20,492,055	377	4	100.00	46.00	-	54.00		หมดสัญญา
2	ก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการและวิทยุการศึกษาสัตตสาร	7/2564	24/12/2563	4/1/2564	2/6/2564	150	1,990,690	148	2	98.67	65.00	-	33.67		
3	ก่อสร้างโรงเรือนหอพักอราธรวิมล	9/2564	28/12/2563	6/1/2564	5/5/2564	120	1,125,000	146	26	100.00	93.00	-	7.00		
4	ก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตร	5/2564	29/1/2564	8/2/2564	7/7/2564	150	1,773,450	113	37	75.33	50.00	-	25.33		
5	ก่อสร้างอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	12/2564	2/2/2564	8/2/2564	7/7/2564	150	1,599,900	113	37	75.33	80.00	4.67	-		ส่งงานเรียบร้อย
6	ปรับปรุงสิ่งทออาคาร 2 คณะอุตสาหกรรม	15/2564	29/1/2564	4/2/2564	3/6/2564	120	1,724,800	117	3	97.50	100.00	2.50	-		ส่งงานเรียบร้อย
7	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการมาตรฐานที่อาคารเรียนการสวนและการพัฒนาทางเดินด้านสิ่งแวดล้อม	10/2564	12/1/2564	1/2/2564	30/6/2564	150	2,119,000	120	30	80.00	11.00	-	69.00		ส่งงานเรียบร้อย
8	ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานวิทยบริการและเขตเทคโนโลยีสารสนเทศ Co-Working Space	13/2564	19/1/2564	27/1/2564	26/5/2564	120	970,454	125	5	100.00	100.00	-	-		
9	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 8 ชั้นพื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) และห้องผลิตสื่อ	18/2564	1/4/2564	1/4/2564	28/8/2564	150	2,200,000	60	90	40.00	1.50	-	38.50		

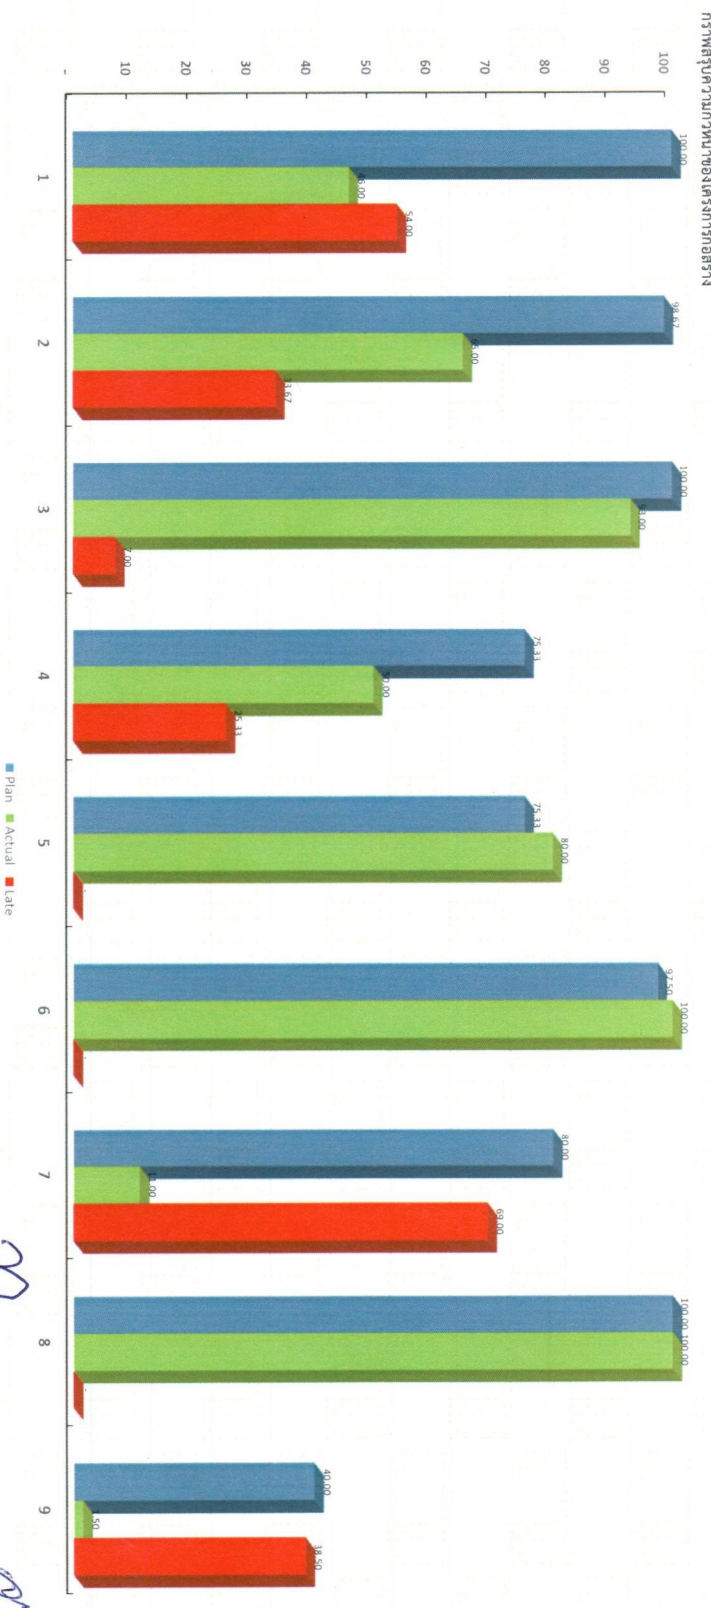

สรุป ณ วันที่ 31/5/2564

หน่วยงานงบประมาณและทรัพย์สิน กองอำนวยการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้รายงาน (นายทรงฤทธิ์ พงษ์ลา) ศึกษาริชาดา ปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ (นายเป็ดดา ไทสินทา) หัวหน้าหน่วยออกเงินและตรวจสอบงานก่อสร้าง
