



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณบุรี
 รัเลขที่ 1686
 วันที่ 6 พ.ค. 2564
 เวลา 9.09 น.

ส่วนราชการ กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร. IP-PHONE ๑๔๒
 ที่ อว.๑๖๒๑.๑๑(๑)/๙๙๓ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 เรื่อง ขอนำส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณบุรี

เรื่องเดิม

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณบุรีได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมและประสานงานต่าง ๆ ในการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย นั้น

ข้อเท็จจริง

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการไปเป็นด้วยความเรียบร้อย งานอาคารสถานที่ฯ จึงขอนำส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพิดา โทนสิมมา)

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

- เรียน อธิการบดี
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- ผอ. สำนักงานอธิการบดี

พิดา โทนสิมมา

ไพโรจน์ เกษมบุตรี

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิชญาดา ธานี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

๖๓๕๔

เรียน อธิการบดี (ฝ่ายรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

ไพโรจน์ เกษมบุตรี

1๗๖๑๖๖๓๒1๕๔๐

๖ พ.ค. ๒๕๖๔

(นายเกษม บุตรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรม/เกษม/ธานี
๒๕๖๔
๖ พ.ค. ๒๕๖๔

(ผศ.ปรีชา อังกรมไฉน)


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณบุรี



สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 โครงการก่อสร้างภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สัญญาเลขที่	ลงวันที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะ เวลา(วัน)	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว(วัน)	เหลือ เวลา(วัน)	ก้าวหน้า แผน (%)	ก้าวหน้า จริง (%)	ความก้าวหน้าเทียบกับแผน		คาดว่า แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
												เร็ว (%)	ช้า (%)		
งบแผ่นดิน															
1	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	20/2563	20/5/2563	20/5/2563	16/5/2564	373	20,492,055	346	27	92.76	39.00		53.76		ล่าช้าเกิน 3 โม 4
2	ปรับปรุงโรงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	3/2564	24/12/2563	4/1/2564	3/5/2564	120	7,20,000	117	3	97.50	84.00		13.50		
3	ก่อสร้างเรือนปฏิบัติการและวิจัยการผลิตสาร	7/2564	24/12/2563	4/1/2564	2/6/2564	150	1,990,690	117	33	78.00	34.00		44.00		
4	ก่อสร้างเวิร์กสเปซหอพักนักเรียน	9/2564	28/12/2563	6/1/2564	5/5/2564	120	1,125,000	115	5	95.83	74.00		21.83		
5	ก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการเกษตร	5/2564	29/1/2564	8/2/2564	7/7/2564	150	1,773,450	82	68	54.67	26.00		28.67		
6	ก่อสร้างอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	12/2564	2/2/2564	8/2/2564	7/7/2564	150	1,599,900	82	68	54.67	45.00		9.67		
7	ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 คณะครุศาสตร์	15/2564	29/1/2564	4/2/2564	3/6/2564	120	1,724,800	86	34	71.67	50.00		21.67		
8	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่นในสิ่งแวดล้อม	10/2564	12/1/2564	1/2/2564	30/6/2564	150	2,119,000	89	61	59.33	10.00		49.33		
9	ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานวิทยบริการและสเปซโคอิเลชันสเปซ co-working space	13/2564	19/1/2564	27/1/2564	26/5/2564	120	970,454	94	26	78.33	73.00		5.33		
10	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและทาสีอาคารเรียน โรงเรียนวิจัยรวม	20/2564	25/2/2564	26/2/2564	26/5/2564	90	302,000	64	26	71.11	100.00	28.89			ส่งงานแล้ว
11	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 8 ให้เป็นพื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) และห้องผลิตสื่อ	18/2564	1/4/2564	1/4/2564	28/8/2564	150	2,200,000	29	121	19.33	1.00		18.33		

กราฟสรุปความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง

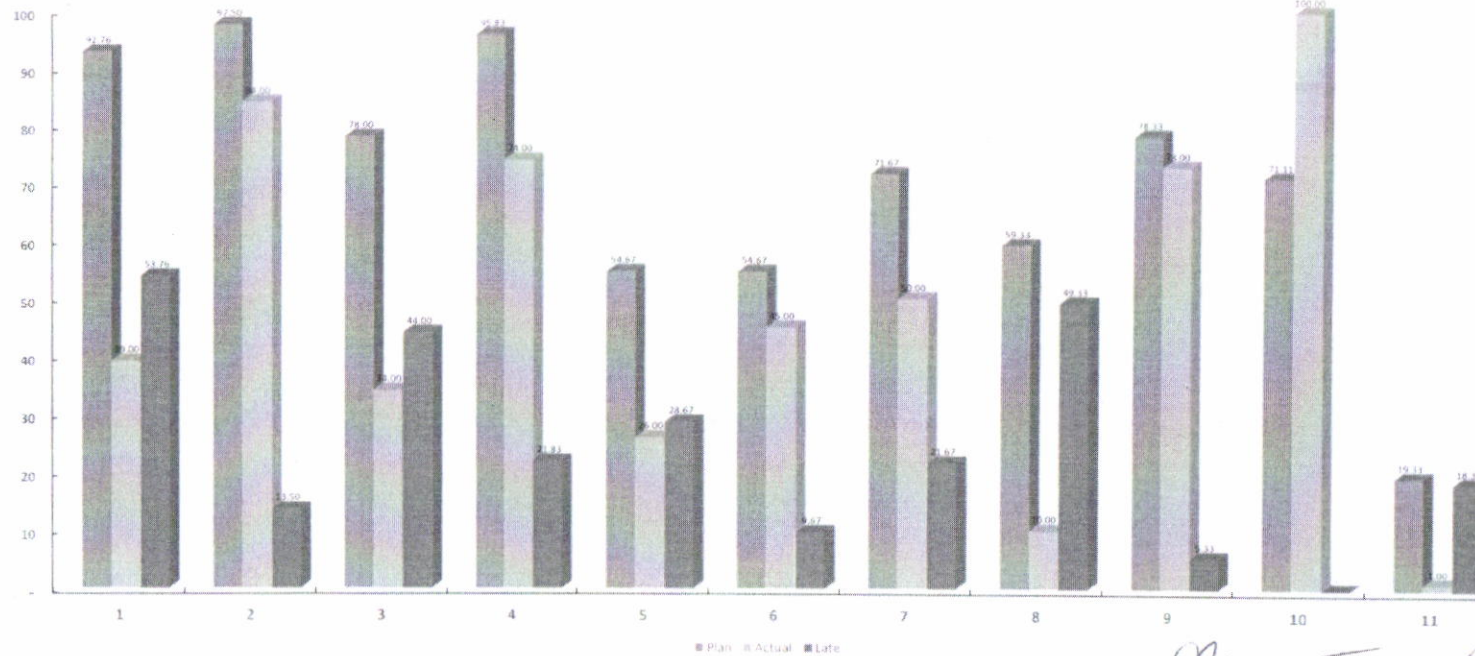

สรุป ณ วันที่
30/4/2564



หัวหน้าหน่วยงานและตรวจสอบ
งานอาคารสถานที่และช่างเทคนิค

ผู้รายงาน

(นายทรงฤทธิ์ พงศ์ลา)
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายนิลา โทณสินดา)

หัวหน้าหน่วยงานและตรวจสอบงานก่อสร้าง
