



# บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 รับเลขที่ 3092  
 วันที่ 4 ธ.ค. 2564  
 เวลา 14.13 น.

ส่วนราชการ กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร. IP-PHONE ๑๔๒

ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑(๑)/๑๖๒๓ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

### เรื่องเดิม

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมและประสานงานต่าง ๆ ในการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย นั้น

### ข้อเท็จจริง

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการไปเป็นด้วยความเรียบร้อย งานอาคารสถานที่ฯ จึงขอนำส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปีดา โทณสิมมา)

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

- เรียน  อธิการบดี
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- ผอ.สำนักงบประมาณ

นิตยาพร  
โทร ๖๖๒๑.๐๑(๑) ๑.๒๖

- จึงผู้ทำ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวพิจญาดา ฮามี่  
ผู้อำนวยการกองกลาง ๕๓๐๖๔

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

ปีดา โทณสิมมา  
เกษม บุตรดี

(นายเกษม บุตรดี)  
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรม/มอ/มท/ส/ร๖๐

๕ ส.ค. ๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญาศาสตร์ มีเกาะ)


“อยู่สกล รักสกล ทนเพื่อสกลนคร”



สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โครงการก่อสร้างภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สัญญาเลขที่	ลงวันที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะ เวลา(วัน)	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว(วัน)	เหลือ เวลา(วัน)	ก้าวหน้า แผน (%)	ก้าวหน้า จริง (%)	ความก้าวหน้าเทียบกับแผน		คาดว่า แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
												เร็ว (%)	ช้า (%)		
งบแผ่นดิน															
1	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชิงเคมีและชีวการแพทย์	20/2563	20/5/2563	20/5/2563	28/5/2564	385	20,492,055	438	53	100.00	54.00	-	46.00	30/11/2021	ทำหนังสือ เร่งรัดครั้งที่ 10
2	ก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการและวิจัยการผลิตสาร	7/2564	24/12/2563	4/1/2564	2/6/2564	150	1,990,690	209	59	100.00	97.00	-	3.00	10/8/2021	ทำหนังสือ เร่งรัดครั้งที่ 1
3	ก่อสร้างรั้วรอบหอพักอาจารย์	9/2564	28/12/2563	6/1/2564	5/5/2564	120	1,125,000	207	-	100.00	100.00	-	-	-	ส่งงานเรียบร้อย
4	ก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษาระดับ	5/2564	29/1/2564	8/2/2564	7/7/2564	150	1,773,450	174	-	100.00	100.00	-	-	-	ส่งงานเรียบร้อย
5	ก่อสร้างอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	12/2564	2/2/2564	8/2/2564	7/7/2564	150	1,599,900	174	-	100.00	100.00	-	-	-	ส่งงานเรียบร้อย
6	ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์	15/2564	29/1/2564	4/2/2564	3/6/2564	120	1,724,800	178	-	100.00	100.00	-	-	-	ส่งงานเรียบร้อย
7	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม	10/2564	12/1/2564	1/2/2564	30/6/2564	150	2,119,000	181	-	100.00	100.00	-	-	-	ส่งงานเรียบร้อย
8	ปรับปรุงพื้นที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ co-working space	13/2564	19/1/2564	27/1/2564	26/5/2564	120	970,454	186	-	100.00	100.00	-	-	-	ส่งงานเรียบร้อย
9	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 8 ให้เป็นพื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) และห้องผลิตสื่อ	18/2564	1/4/2564	1/4/2564	28/8/2564	150	2,200,000	121	29	80.67	30.00	-	50.67	-	
10	งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและศูนย์บริการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	16/2564	2/2/2564	8/2/2564	6/8/2564	180	4,690,000	174	6	96.67	70.00	-	26.67	-	
11	ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดภายในมหาวิทยาลัย	22/2564	24/5/2564	1/6/2564	27/3/2565	300	24,950,000	60	240	20.00	2.00	-	18.00	-	

กราฟสรุปความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง

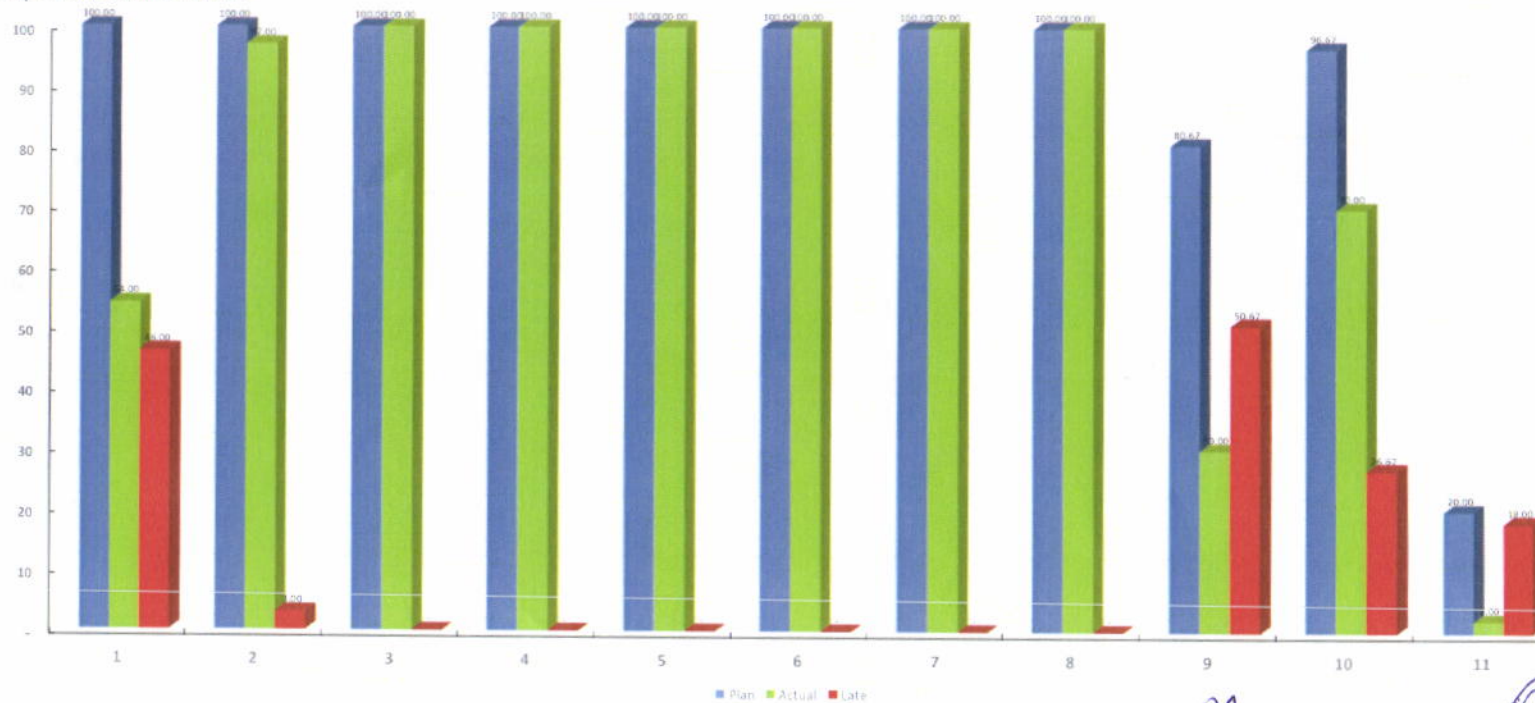

สรุป ณ วันที่  
31/7/2564



หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง  
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ผู้รายงาน

(นาย ดร.หญิง พุทธิลา)  
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(นาย ปิศา โชนสิริมา)

หัวหน้าหน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
