



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณบุรี
 รับเลขที่ 3742
 วันที่ 2 ก.ย. 2564
 เวลา 16.30 น.

ส่วนราชการ กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร. IP-PHONE ๑๕๒

ที่ อว.๐๖๒๑.๐๑(๑)/๑๘๘๓ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณบุรี

เรื่องเดิม

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณบุรีได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมและประสานงานต่าง ๆ ในการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย นั้น

ข้อเท็จจริง

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการไปเป็นด้วยความเรียบร้อย งานอาคารสถานที่ฯ จึงขอส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน อธิการบดี
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 ผอ.สำนักงานอธิการบดี

(นายปีดา โทณสิมมา)

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

น.ส.ปีดา โทณสิมมา
 หัวหน้างาน

เรียน อธิการบดี
 เพื่อโปรดทราบ
 ททชบ
 ๒ ก.ย. ๖๔

ททชบ
 มทชบ, สทชบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนิชญาดา ธาณี)
 ผู้อำนวยการกองกลาง ๒๓๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาภูมิচিতปรีชา)
 ภัทธรชมนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณบุรี

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

๒๓๖๔


(นายเกษม บุตรดี)
 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี



สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โครงการก่อสร้างภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สัญญาเลขที่	ลงวันที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะ เวลา(วัน)	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว(วัน)	เหลือ เวลา(วัน)	ก้าวหน้า แผน (%)	ก้าวหน้า จริง (%)	ความก้าวหน้าเทียบกับแผน		ค่าว่า แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
												เร็ว (%)	ช้า (%)		
งบแผ่นดิน															
1	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	20/2563	20/5/2563	20/5/2563	28/5/2564	385	20,492,055	469	84	100.00	60.00	-	40.00	30 พ.ย. 64	ทำหนังสือ เร่งรัดครั้งที่ 10
2	ก่อสร้างโรงเรียนปฏิบัติการและวิจัยการผลิตสาร	7/2564	24/12/2563	4/1/2564	2/6/2564	150	1,990,690	240		100.00	100.00	-	-		ส่งงานเรียบร้อย
3	ก่อสร้างรั้วรอบหอพักเยาวชน	9/2564	28/12/2563	6/1/2564	5/5/2564	120	1,125,000	0		100.00	100.00	-	-		ส่งงานเรียบร้อย
4	ก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจการเกษตร	5/2564	29/1/2564	8/2/2564	7/7/2564	150	1,773,450	0		100.00	100.00	-	-		ส่งงานเรียบร้อย
5	ก่อสร้างอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	12/2564	2/2/2564	8/2/2564	7/7/2564	150	1,599,900	0		100.00	100.00	-	-		ส่งงานเรียบร้อย
6	ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 คณะครุศาสตร์	15/2564	29/1/2564	4/2/2564	3/6/2564	120	1,724,800	0		100.00	100.00	-	-		ส่งงานเรียบร้อย
7	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม	10/2564	12/1/2564	1/2/2564	30/6/2564	150	2,119,000	0		100.00	100.00	-	-		ส่งงานเรียบร้อย
8	ปรับปรุงพื้นที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ co-working space	13/2564	19/1/2564	27/1/2564	26/5/2564	120	970,454	0		100.00	100.00	-	-		ส่งงานเรียบร้อย
9	ก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร 8 ให้เป็นพื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) และห้องผลิตสื่อ	18/2564	1/4/2564	1/4/2564	28/8/2564	150	2,200,000	152	2	100.00	90.00	-	10.00	30 ก.ย. 64	
10	งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการศูนย์บริการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	16/2564	2/2/2564	8/2/2564	6/8/2564	180	4,690,000	205	25	100.00	90.00	-	10.00	30 ก.ย. 64	
11	ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย	22/2564	24/5/2564	1/6/2564	27/3/2565	300	24,950,000	91	209	30.33	4.00	-	26.33	31 มี.ค. 65	ค่าว่าส่งงวดที่ 1(15-9-64)
12	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องนำอนุบาลโรงเรียนวิเชียรมาตย์มหาสิริราชภัฏสกลนคร	26/2564	26/8/2564	26/8/2564	23/11/2564	90	890,000	5	85	5.56	15.00	9.44	-		
13	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตู 1	28/2564	3/8/2564	3/8/2564	1/10/2564	60	466,800	28	32	46.67	50.00	3.33	-	30 ก.ย. 64	

กราฟสรุปความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง

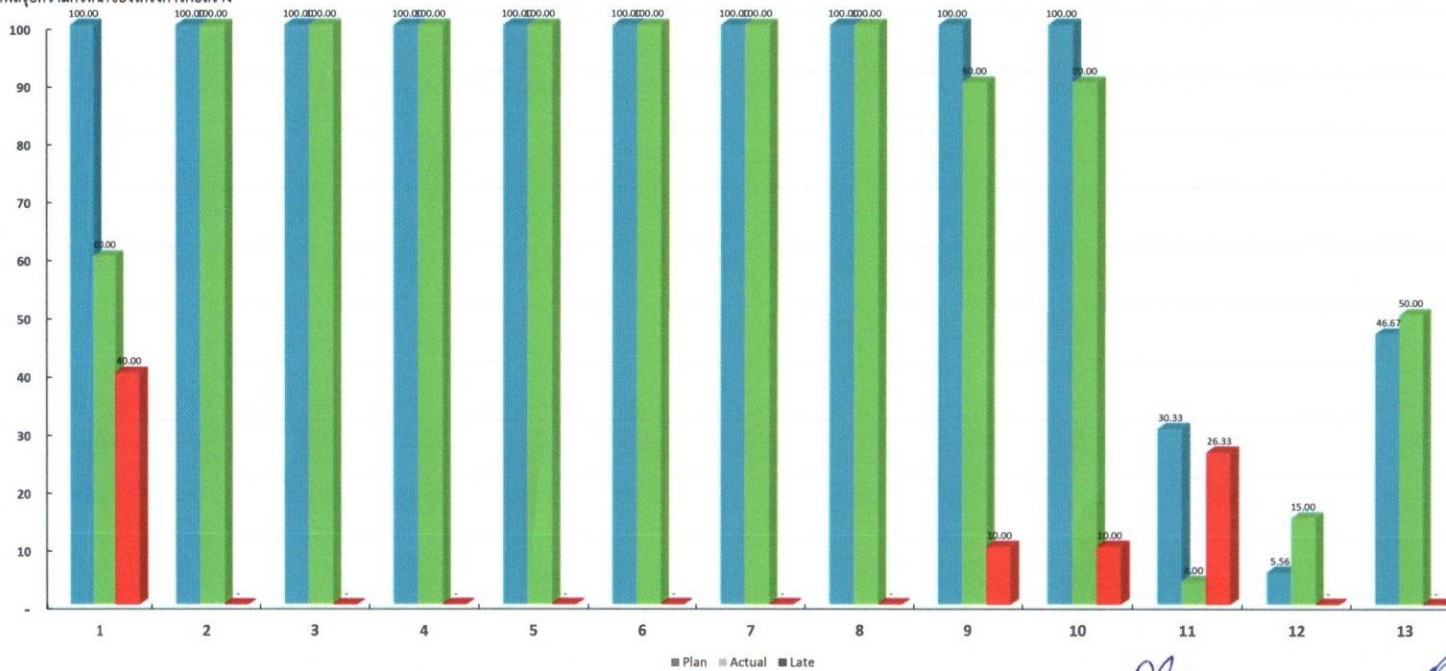

สรุป ณ วันที่
31/8/2564



หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ผู้รายงาน (นายทรงฤทธิ์ พุทธิลา) วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบ (นายปิตา โทณสิมมา) หัวหน้าหน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
