



# บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
รับเลขที่ 4309  
วันที่ 30 ก.ย. 2564  
เวลา 16.08.4

ส่วนราชการ... กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร. IP-PHONE ๑๔๒

ที่... อว ๐๖๒๑.๐๑(๑)/๒๑๑๗ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง... ขอนำส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

### เรื่องเดิม

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมและประสานงานต่าง ๆ ในการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย นั้น

### ข้อเท็จจริง

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการไปเป็นด้วยความเรียบร้อย งานอาคารสถานที่ฯ จึงขอนำส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปิตา โทณลิ้มมา)

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

๗๗๖

๒๕๖๓ 15๗๐

1๗๙๔

เรียน  อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผอ.สำนักงานอธิการบดี

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศุภิญญา ธานี)

ผู้อำนวยการกองกลาง ๓๐/๙/๖๔

เรียน อธิการบดี

เพื่อไปทำ งานอาคารสถานที่

.....

1 กย 64

(รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 โครงการก่อสร้างภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สัญญาเลขที่	ลงวันที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะ (เวลา/วัน)	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว(วัน)	เหลือ (เวลา/วัน)	ก้าวหน้า แผน (%)	ก้าวหน้า จริง (%)	ความก้าวหน้าเทียบกับแผน		คาดว่า แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
												เร็ว (%)	ช้า (%)		
งบแผ่นดิน															
1	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์	20/2564	20/9/2564	20/9/2564	25/5/2564	373	20,492,035	499	126	100.00	80.00		11.00	30 พ.ย. 64	ทำหนังสือ เสร็จวันที่ 10
2	ก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการและฝึกการผลิตยาง	7/2564	24/12/2563	4/11/2564	2/6/2564	190	1,390,690	270		100.00	100.00				ผลงานเรียบร้อย
3	ก่อสร้างโรงเรือนผลิตยางรม	9/2564	28/12/2563	6/11/2564	5/3/2564	120	1,123,000	0		100.00	100.00				ผลงานเรียบร้อย
4	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	5/2564	29/1/2564	8/2/2564	7/7/2564	190	1,773,450	0		100.00	100.00				ผลงานเรียบร้อย
5	ก่อสร้างอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ มลพิษเพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	12/2564	2/2/2564	8/2/2564	7/7/2564	190	1,599,900	0		100.00	100.00				ผลงานเรียบร้อย
6	ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์	13/2564	29/1/2564	4/2/2564	3/6/2564	120	1,724,800	0		100.00	100.00				ผลงานเรียบร้อย
7	ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารพื้นฐานเพื่อการเรียนการสอนและกีฬาพื้นน้ำจืดระดับต้นเชิงมรดกโลก	10/2564	12/1/2564	1/2/2564	30/6/2564	190	2,119,000	0		100.00	100.00				ผลงานเรียบร้อย
8	ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานบริการและพบปะในอาคารศูนย์ co-working space	13/2564	19/1/2564	27/1/2564	26/5/2564	120	970,454	0		100.00	100.00				ผลงานเรียบร้อย
9	ก่อสร้างโรงเรือนผลิตยางรม 8 ไม่น้ำมันที่ทำงานรวม (Co-Working Space) และห้องผลิตยางรม	18/2564	1/4/2564	1/4/2564	28/8/2564	150	2,200,000	182		100.00	100.00				ผลงานเรียบร้อย
10	ทำนบกั้นน้ำอาคารศูนย์บริการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	16/2564	2/2/2564	5/2/2564	6/8/2564	180	4,690,090	235	55	100.00	100.00				ผลงานเรียบร้อย
11	ก่อสร้างพื้นที่บรณสักขีพระบรมพระปรางค์ภายในมหาวิทยาลัย	22/2564	24/5/2564	1/6/2564	27/3/2565	900	24,350,000	121	179	40.33	15.00		25.33	31 มี.ค. 65	คาดว่าจะวันที่ 1(15-9-64)
12	ปรับปรุงภูมิทัศน์และห้องเรียนภายในบริเวณแห่งแรกหลังอาคารศึกษาศาสตร์	26/2564	26/8/2564	26/8/2564	23/11/2564	90	890,000	35	55	38.89	76.00	37.11			เสร็จวันที่ 1 (8-9-64)
13	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตู 1	28/2564	3/8/2564	3/8/2564	1/10/2564	60	466,800	58	2	96.67	100.00	3.33		30 ก.ย. 64	เสร็จเรียบร้อย

กราฟสรุปความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง

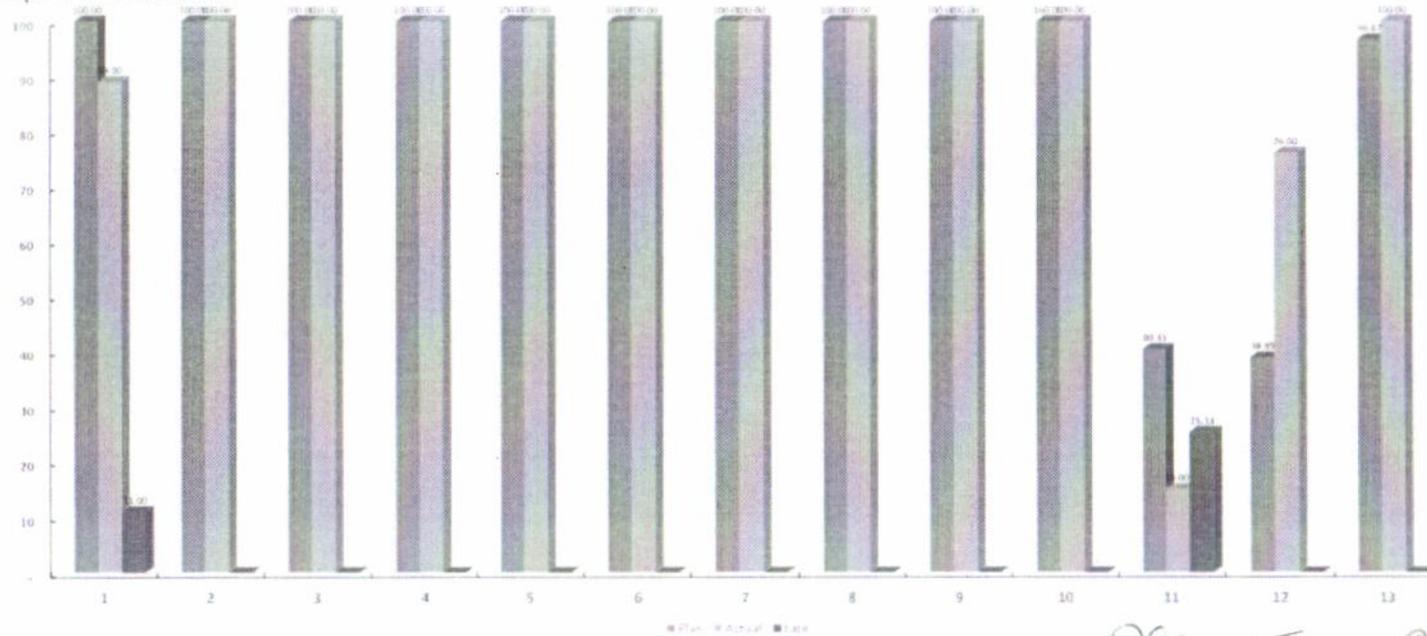

สรุป ณ วันที่  
30/9/2564



มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
การก่อสร้างภายในและระบบสารสนเทศ

ผู้รายงาน

(นายจรรยาพรณ์ พุทธิอา)

โครงการก่อสร้าง

ผู้ตรวจสอบ

(นายชิตา โพนสิงห์)

หัวหน้าหน่วยงานและตรวจสอบรายงาน
