



# บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รับเลขที่ 5344
วันที่ 1 ธ.ค. 2564
เวลา 16-34 5

ส่วนราชการ กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร. IP-PHONE ๑๔๒

ที่ อว.๐๖๒๑.๐๑(๑)/๒๖๗๘ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

## เรื่องเดิม

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมและประสานงานต่าง ๆ ในการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย นั้น

## ข้อเท็จจริง

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

## ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการไปเป็นด้วยความเรียบร้อย งานอาคารสถานที่ฯ จึงขอนำส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปีตา โทณสิมมา)

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรียน  อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผอ.สำนักงานอธิการบดี

.....

.....

.....

.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

.....  
 (นางสาวพิชญาดา ธาณี)  
 ผู้อำนวยการกองกลาง ๗๖๒๔

ททป

.....

3 ๓๗๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล)


รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร



สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โครงการก่อสร้างภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สัญญาเลขที่	ลงวันที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้ว (วัน)	เหลือ เวลา (วัน)	ก้าวหน้า แผน (%)	ก้าวหน้า จริง (%)	ความก้าวหน้าเทียบกับแผน		คาดว่าแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
												เร็ว (%)	ช้า (%)		
<b>งบแผ่นดิน</b>															
1	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	20/2563	20/5/2563	20/5/2563	28/5/2564	373	20,492,055	560	187	100.00	98.20	-	1.80	30 ธ.ค. 64	ทำหนังสือ เรงรัดครั้งที่ 10
2	ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย	22/2564	24/5/2564	1/6/2564	27/3/2565	300	24,950,000	182	118	60.67	26.00	-	34.67	31 มี.ค. 65	
3	ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 7	5/2565	15/10/2564	26/10/2564	24/3/2565	150	1,736,000	35	115	23.33	18.00	-	5.33		
4	ก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานและหลังคาถนนลาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	7/2565	15/10/2564	20/10/2564	16/2/2565	120	1,096,000	41	79	34.17	18.00	-	16.17		
5	ก่อสร้างลานกิจกรรมและโรงจอดรถอาคารศูนย์และดนตรี	2/2565	19/10/2564	26/10/2564	22/2/2565	120	769,000	35	85	29.17	5.00	-	24.17		
6	จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ อาคาร 13	10/2565	8/11/2564	15/11/2564	13/5/2565	180	2,350,000	15	165	8.33	0.00	-	8.33		
7	ปรับปรุงบ่อเก็บน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา	11/2565	29/10/2564	17/1/2565	16/5/2565	120	1,475,000	0	-	-	-	-	-		ยังไม่เริ่มโครงการ
8	ก่อสร้างขยายห้องเรียนประถมศึกษา โครงการขยายห้องเรียน	9/2565	1/11/2564	1/12/2564	27/8/2565	270	8,080,000	0	-	-	-	-	-		ยังไม่เริ่มโครงการ
9	ปรับปรุงห้องประชุมสร้อยสุวรรณา	3/2565	8/11/2564	15/11/2564	13/4/2565	150	1,488,000	15	135	10.00	3.00	-	7.00		
10	ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 11 ชั้นที่ 2	4/2565	15/10/2564	18/10/2564	16/12/2564	60	195,000	43	17	71.67	100.00	28.33	-		ส่งงานแล้ว
11	ปรับปรุงทาสีและซ่อมแซมห้องประชุม/สัมมนาอาคารบัณฑิตวิทยาลัย	6/2565	1/11/2564	8/11/2564	5/2/2565	90	529,000	22	68	24.44	5.00	-	19.44		

กราฟสรุปความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง

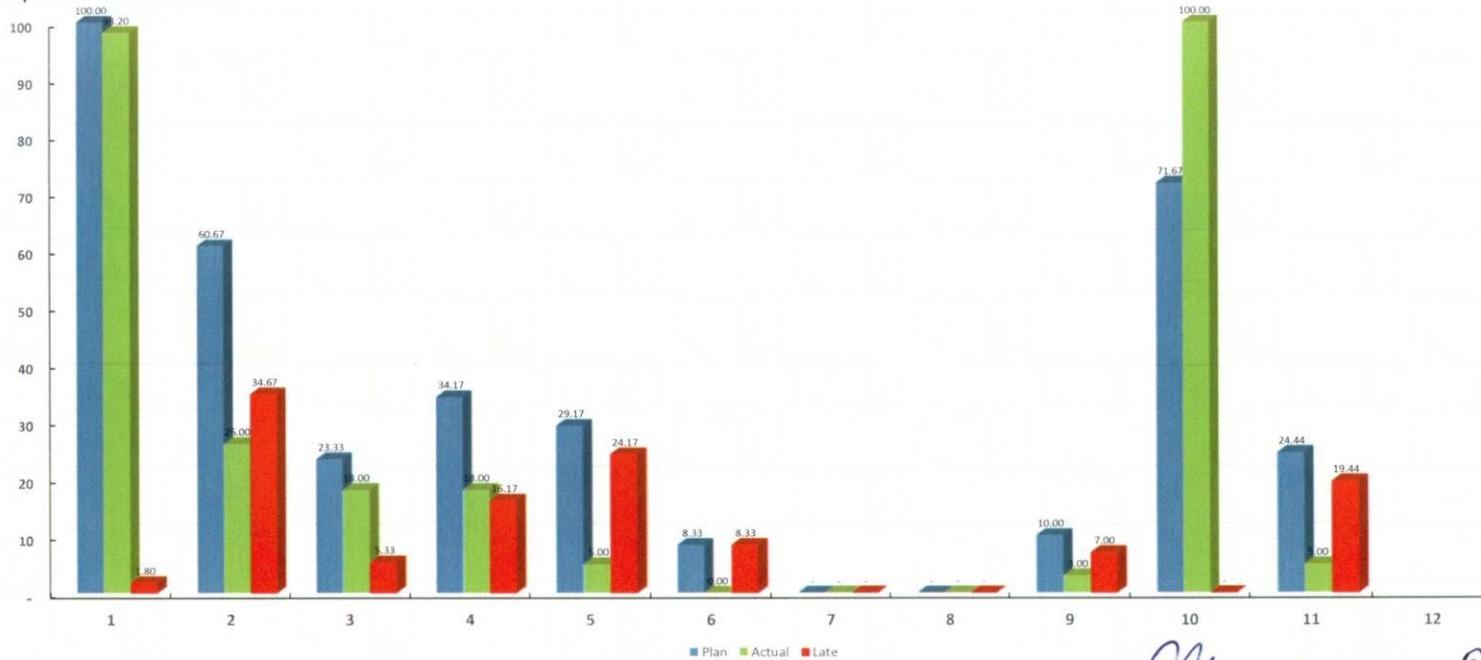

สรุป ณ วันที่ 30/11/2564



หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง  
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ผู้รายงาน

(นายทรงฤทธิ์ พุทธลา)

วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายปิตา โพนสิมมา)

หัวหน้าหน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
