




สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 โครงการก่อสร้างภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สัญญาเลขที่	ลงวันที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะ เวลา(วัน)	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว(วัน)	เหลือ เวลา(วัน)	ก้าวหน้า แผน (%)	ก้าวหน้า จริง (%)	ความก้าวหน้าเทียบกับแผน		คาดว่า แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
				เร็ว (%)	ช้า (%)										
งบแผ่นดิน															
1	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	20/2563	20/5/2563	20/5/2563	28/5/2564	373	20,492,055	622	- 249	100.00	99.50	-	0.50	10 ก.พ. 65	เหลือ งวดสุดท้าย
2	ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย	22/2564	24/5/2564	1/6/2564	27/3/2565	300	24,950,000	244	56	81.33	50.00	-	31.33	30 เม.ย. 65	
3	ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 7	5/2565	15/10/2564	26/10/2564	24/3/2565	150	1,736,000	97	53	64.67	38.00	-	26.67		
4	ก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานและหลังคาเกินภาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	7/2565	15/10/2564	20/10/2564	16/2/2565	120	1,096,000	103	17	85.83	32.00	-	53.83		
5	ก่อสร้างลานกิจกรรมและโรงจอดรถอาคารศูนย์วิจัยและดนตรี	2/2565	19/10/2564	26/10/2564	22/2/2565	120	769,000	97	23	80.83	50.00	-	30.83		
6	จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการดนตรีสงฆ์ อาคาร 13	10/2565	8/11/2564	15/11/2564	13/5/2565	180	2,350,000	77	103	42.78	0.00	-	42.78		ยกเลิกสัญญา
7	ปรับปรุงบ่อน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา	11/2565	29/10/2564	17/1/2565	16/5/2565	120	1,475,000	14	106	11.67	0.00	-	11.67		
8	ก่อสร้างขยายห้องเรียนประถมศึกษา โครงการขยายห้องเรียน	9/2565	1/11/2564	1/12/2564	27/8/2565	270	8,080,000	61	209	22.59	9.20	-	13.39		
9	ปรับปรุงห้องประชุมสร้อยสุวรรณา	3/2565	8/11/2564	15/11/2564	13/4/2565	150	1,488,000	77	73	51.33	24.00	-	27.33		
10	ปรับปรุงทาสีและซ่อมแซมห้องประชุม/สัมมนาอาคารบัณฑิตวิทยาลัย	6/2565	1/11/2564	8/11/2564	5/2/2565	90	529,000	84	6	93.33	100.00	6.67	-		ส่งงานเรียบร้อย
11	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอนครุศาสตร์	8/2565	15/1/2565	6/1/2565	1/11/2565	300	17,154,000	25	275	8.33	1.00	-	7.33		
12	ก่อสร้างถนนและลานจอดรถบริเวณอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	19/2564	17/1/2565	17/1/2565	16/5/2565	120	17,154,000	14	106	11.67	5.00	-	6.67		

กราฟสรุปความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง

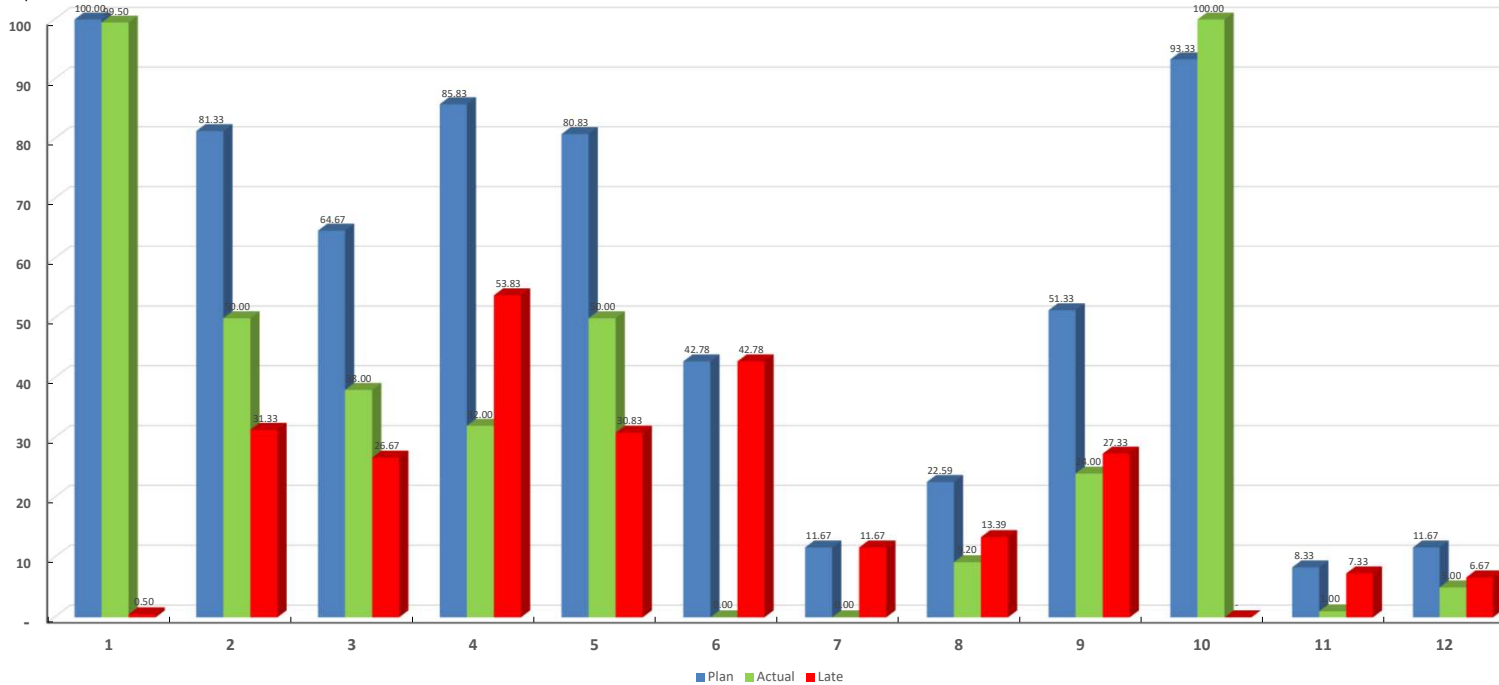

สรุป ณ วันที่  
31/1/2565



หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง  
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ผู้รายงาน

(นายทรงฤทธิ์ พุทธิลา)  
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายปิตา โทณสิมา)  
หัวหน้าหน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
