



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร. IP-PHONE ๑๔๒

ที่... อว.๐๖๒๑.๐๑(๑)/๔๔๔... วันที่... ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง... ขอนำส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

## เรื่องเดิม

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมและประสานงานต่าง ๆ ในการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย นั้น

## ข้อเท็จจริง

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

## ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการไปเป็นด้วยความเรียบร้อย งานอาคารสถานที่ฯ จึงขอนำส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปีตา โทณสิมมา)


หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ



สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โครงการก่อสร้างภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สัญญาเลขที่	ลงวันที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะ เวลา(วัน)	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว(วัน)	เหลือ เวลา(วัน)	ก้าวหน้า แผน (%)	ก้าวหน้า จริง (%)	ความก้าวหน้าเทียบกับแผน เร็ว (%)	ช้า (%)	หมายเหตุ
	<b>งบแผ่นดิน</b>													
1	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	20/2563	20/5/2563	20/5/2563	28/5/2564	373	20,492,055	650	-	100.00	99.75	0.25		28 ก.พ. 65 เหลือ งดตัดท้าย
2	ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศในมหาวิทยาลัย	22/2564	24/5/2564	1/6/2564	27/3/2565	300	24,950,000	272	28	90.67	58.00	32.67		30 เม.ย. 65
3	ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 7	5/2565	15/10/2564	26/10/2564	24/3/2565	150	1,736,000	125	25	83.33	48.00	35.33		
4	ก่อสร้างปรับปรุงห้องเสาน้ำมันและห้องล้างภาชนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	7/2565	15/10/2564	20/10/2564	16/2/2565	120	1,096,000	131	11	100.00	69.00	31.00		
5	ก่อสร้างงานกิจกรรมและโรงจอดรถอาคารสุทธินิธิและดนตรี	2/2565	19/10/2564	26/10/2564	22/2/2565	120	769,000	125	5	100.00	90.00	10.00		
6	จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอบรมประมง อากาศ 13	10/2565	8/11/2564	15/11/2564	13/5/2565	180	2,350,000	105	75	58.33	0.00	58.33		ประกาศประมูลใหม่
7	ปรับปรุงขอบเก็บน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา	11/2565	29/10/2564	17/1/2565	16/5/2565	120	1,475,000	42	78	35.00	0.00	35.00		ผู้รับจ้างยังไม่เข้ามา
8	ก่อสร้างขยายห้องเรียนประถมศึกษา โครงการขยายห้องเรียน	9/2565	1/11/2564	1/12/2564	27/8/2565	270	8,080,000	89	181	32.96	10.00	22.96		
9	ปรับปรุงห้องประชุมเสวนาสุวรรณานา	3/2565	8/11/2564	15/11/2564	13/4/2565	150	1,488,000	105	45	70.00	36.00	34.00		ส่งงานเรียบร้อยแล้ว
10	ปรับปรุงทางสี่เหลี่ยมห้องประชุม/สัมมนาอาคารบัณฑิตวิทยาลัย	6/2565	1/11/2564	8/11/2564	5/2/2565	90	529,000	112	22	100.00	100.00	-		
11	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอบครูผู้สอน	8/2565	15/1/2565	6/1/2565	1/11/2565	300	17,154,000	53	247	17.67	1.00	16.67		
12	ก่อสร้างถนนและลานจอดรถบริเวณอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชิงเทคโนโลยี	19/2564	17/1/2565	17/1/2565	16/5/2565	120	17,154,000	42	78	35.00	2.00	33.00		
13	ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการเรียนรวมทางเทคนิคการสัตวศาสตร์	15/2565	31/1/2565	7/2/2565	6/6/2565	120	1,330,000	21	99	17.50	0.00	17.50		ผู้รับจ้างยังไม่เข้ามา
14	ปรับปรุงสนามฟุตบอล	17/2565	21/1/2565	28/1/2565	27/4/2565	90	1,111,111	31	59	34.44	0.00	34.44		

ภาพสรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง

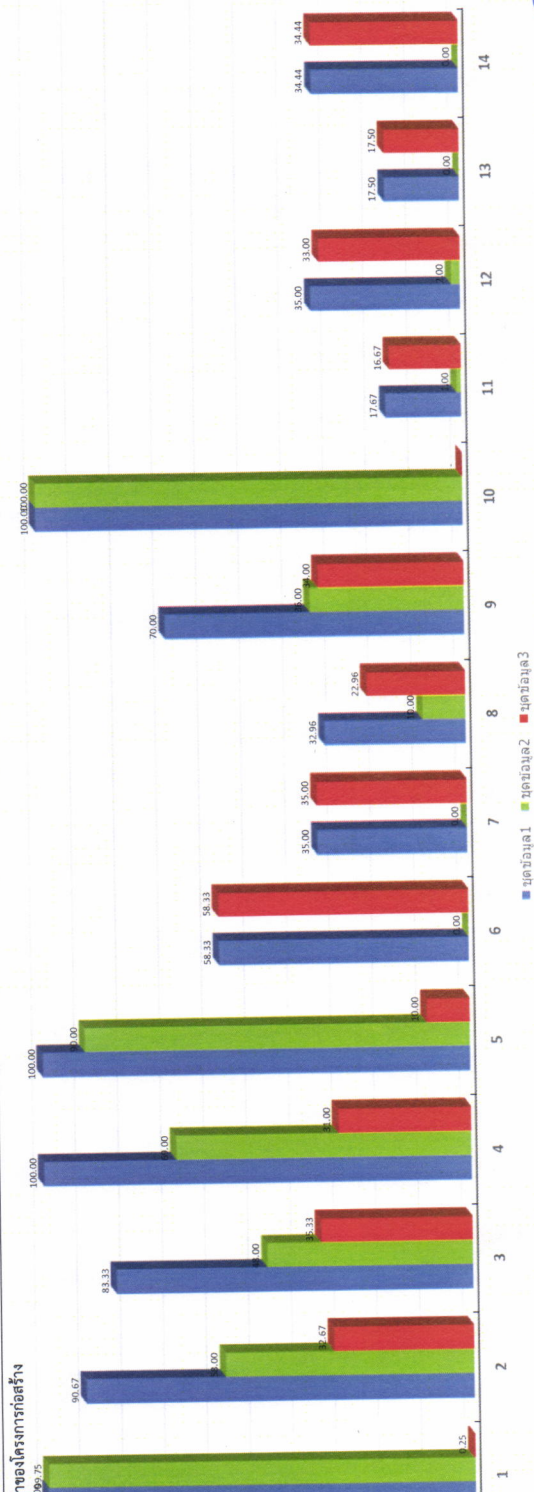

สรุป ณ วันที่ 28/2/2565



หน้าออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง  
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ผู้รายงาน (นายทรงฤทธิ์ พงษ์ลา)

ผู้ตรวจสอบ (นายวิชา โพนสีมา)

หัวหน้าหน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง  
วิศวกรรมโยธา ปฏิบัติการ
