



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รับเลขที่... 2309
 วันที่... 2 มิ.ย. 2565
 เวลา... 13.18 น.

ส่วนราชการ กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร. IP-PHONE ๑๔๒

ที่ อว.๐๖๒๑.๐๑(๑)/๑๐๗๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอนำส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่องเดิม

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมและประสานงานต่าง ๆ ในการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย นั้น

ข้อเท็จจริง

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการไปเป็นด้วยความเรียบร้อย งานอาคารสถานที่ฯ จึงขอนำส่งสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจำวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- เรียน อธิการบดี
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 ผอ.สำนักงานอธิการบดี

(นายปีตา โทณสิมมา)

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นางสาวพิชญาดา ธาณี
 ผู้อำนวยการกองกลาง
 กน. ๒๕๖๕

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

1.1๕๐1๑๖๓๕๕
 1.1๖๐๑๐๖๒๑๐๑๑๐

(นายเกษม บุตรดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

- จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
 จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวพิชญาดา ธาณี
 ผู้อำนวยการกองกลาง ๒๕๖๕

เรียน อธิการบดี
 เฉลิมพร พงษ์พานิช
 ๑๕๖๖๒๕๖๕

กน
 ๒๕๖๕
 ๒๕๖๕

๒๕๖๕
 (รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล)
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคีร์ต ชาญชิตปรีชา)
 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร




สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โครงการก่อสร้างภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สัญญาเลขที่	ลงวันที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะ เวลา(วัน)	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว(วัน)	เหลือ เวลา(วัน)	ก้าวหน้า แผน (%)	ก้าวหน้า จริง (%)	ความก้าวหน้าเทียบกับแผน		คาดว่า แล้วเสร็จ	หมายเหตุ	
												เร็ว (%)	ช้า (%)			
งบแผ่นดิน																
1	ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย	22/2564	24/5/2564	1/6/2564	27/3/2565	300	24,950,000	364	64	100.00	97.00	-	3.00	30 มี.ย. 65	สิ้นสุดสัญญา	
2	ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 7	5/2565	15/10/2564	26/10/2564	24/3/2565	150	1,736,000	217	67	100.00	81.00	-	19.00		สิ้นสุดสัญญา	
3	ก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานและหลังคากันสาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	7/2565	15/10/2564	20/10/2564	16/2/2565	120	1,096,000	223	103	100.00	86.00	-	14.00	30 มี.ย. 65	สิ้นสุดสัญญา	
4	ก่อสร้างลานกิจกรรมและโรงจอดรถอาคารศูนย์วิจัยและดนตรี	2/2565	19/10/2564	26/10/2564	22/2/2565	120	769,000	217	-	100.00	100.00	-	-		ส่งงานเรียบร้อยแล้ว	
5	จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอนุภาคประสงค์ อาคาร 13	25/2565	28/3/2565	4/4/2565	30/9/2565	180	2,488,000	57	123	31.67	1.00	-	30.67			
6	ปรับปรุงบ่อน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา	11/2565	29/10/2564	17/1/2565	16/5/2565	120	1,475,000	134	14	100.00	65.00	-	35.00			
7	ก่อสร้างขยายห้องเรียนประถมศึกษา โครงการขยายห้องเรียน	9/2565	1/11/2564	1/12/2564	27/8/2565	270	8,080,000	181	89	67.04	15.50	-	51.54			
8	ปรับปรุงห้องประชุมสร้อยสุวรรณา	3/2565	8/11/2564	15/11/2564	13/4/2565	150	1,488,000	197	-	100.00	100.00	-	-		ส่งงานเรียบร้อยแล้ว	
9	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอนครุศาสตร์	8/2565	15/1/2565	6/1/2565	1/11/2565	300	17,154,000	145	155	48.33	8.50	-	39.83			
10	ก่อสร้างถนนและลานจอดรถบริเวณอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์หิวใจเทคโนโลยีและนวัตกรรม	19/2564	20/2564	17/1/2565	16/5/2565	120	3,344,000	134	14	100.00	75.00	-	25.00			
11	ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการเรียนรวมทางเทคนิคการสัตวศาสตร์	15/2565	31/1/2565	7/2/2565	6/6/2565	120	1,330,000	113	7	94.17	40.00	-	54.17			
12	ปรับปรุงสนามฟุตบอล	17/2565	21/1/2565	28/1/2565	27/4/2565	90	1,111,111	123	-	100.00	100.00	-	-		ส่งงานเรียบร้อยแล้ว	
13	ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมคนพิการ	20/2565	14/2/2565	28/2/2565	27/6/2565	120	1,374,000	92	28	76.67	21.00	-	55.67			
14	ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1	26/2565	25/3/2565	1/4/2565	29/6/2565	90	730,000	60	30	66.67	3.00	-	63.67			
15	ก่อสร้างอาคารอนุภาคประสงค์คณะวิทยาการจัดการ	14/2565	28/3/2565	1/4/2565	26/11/2565	240	7,500,000	60	180	25.00	0.00	-	25.00		เข้างานล่าช้า	
16	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	22/2565	1/3/2565	9/3/2565	6/7/2565	120	777,777	83	37	69.17	30.00	-	39.17			
17	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยในอาคาร 1	24/2565	1/4/2565	1/4/2565	29/7/2565	120	1,798,000	60	60	50.00	20.00	-	30.00			

กราฟสรุปความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง

งบประมาณรวมทั้งหมด 77,200,888 บาท

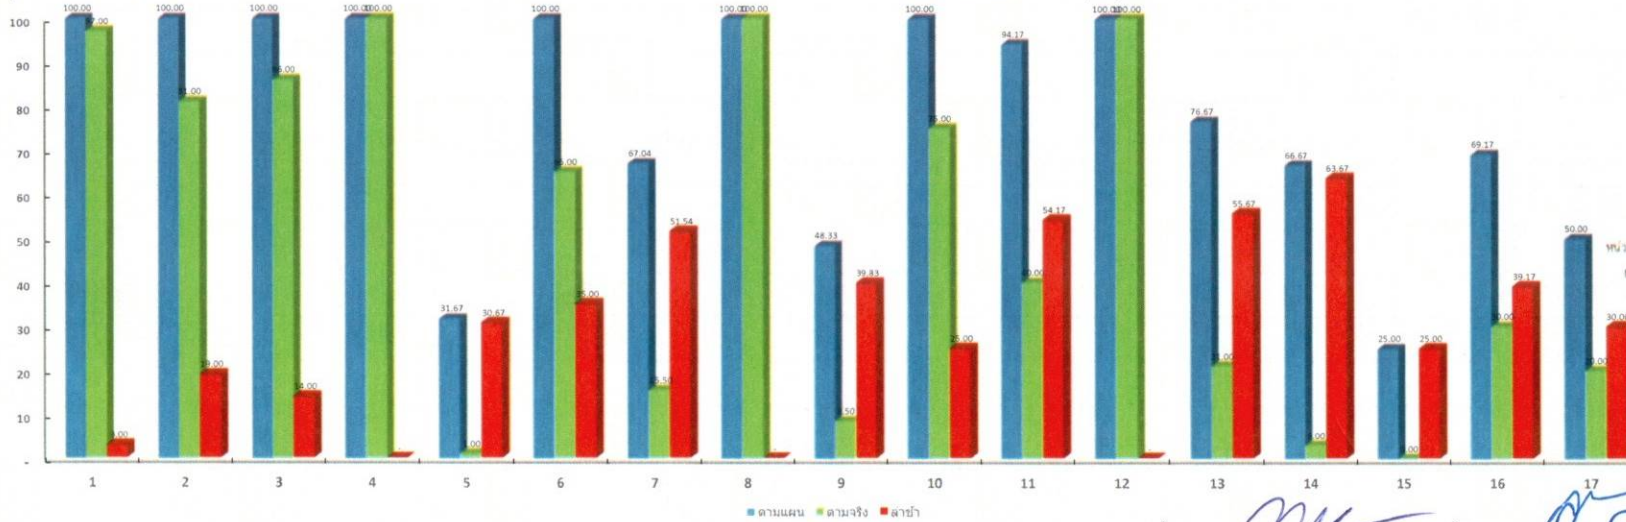

สรุป ณ วันที่ 31/5/2565



นายชยศักดิ์ และนางจรรยา ก่อสร้าง
สำนักการดำเนินงานและอาคารพาณิชย์

ผู้รายงาน (นายพรพงษ์ พุทธิลา)

ผู้ตรวจสอบ (นายบิดา โทณสิมมา)

หัวหน้าหน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
