




สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2567 โครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สัญญาเลขที่	ลงวันที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะเวลา(วัน)	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้ว(วัน)	เหลือเวลา(วัน)	ก้าวหน้าแผน (%)	ก้าวหน้าจริง (%)	ความก้าวหน้าเทียบกับแผน		หมายเหตุ	วันที่รายงาน	
												เร็ว (%)	ช้า (%)			
1	ปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	21/2566	19/9/2566	02/10/66	27/07/67	300	14,495,000	309	-	9	100.00	80.00	-	20.00	-	สรุป ณ วันที่ 05/08/2567
2	ปรับปรุงถนนและลานจอดรถบริเวณ อาคาร 6 และศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	6/2567	02/04/67	09/04/67	06/06/67	60	495,000	120	-	60	100.00	100.00	-	-	ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว	
3	ปรับปรุงขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงอาคารครุศาสตร์	7/2567	02/07/67	10/07/67	07/09/67	60	907,979	28	32	100.00	100.00	-	-	ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว		
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12/2567	31/07/67	07/08/67	04/12/67	120	2,724,900	0	120	-	0.00	-	-	เริ่มสัญญา 07/08/67		

กราฟสรุปความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง

งบประมาณรวมทั้งหมด 18,622,879 บาท

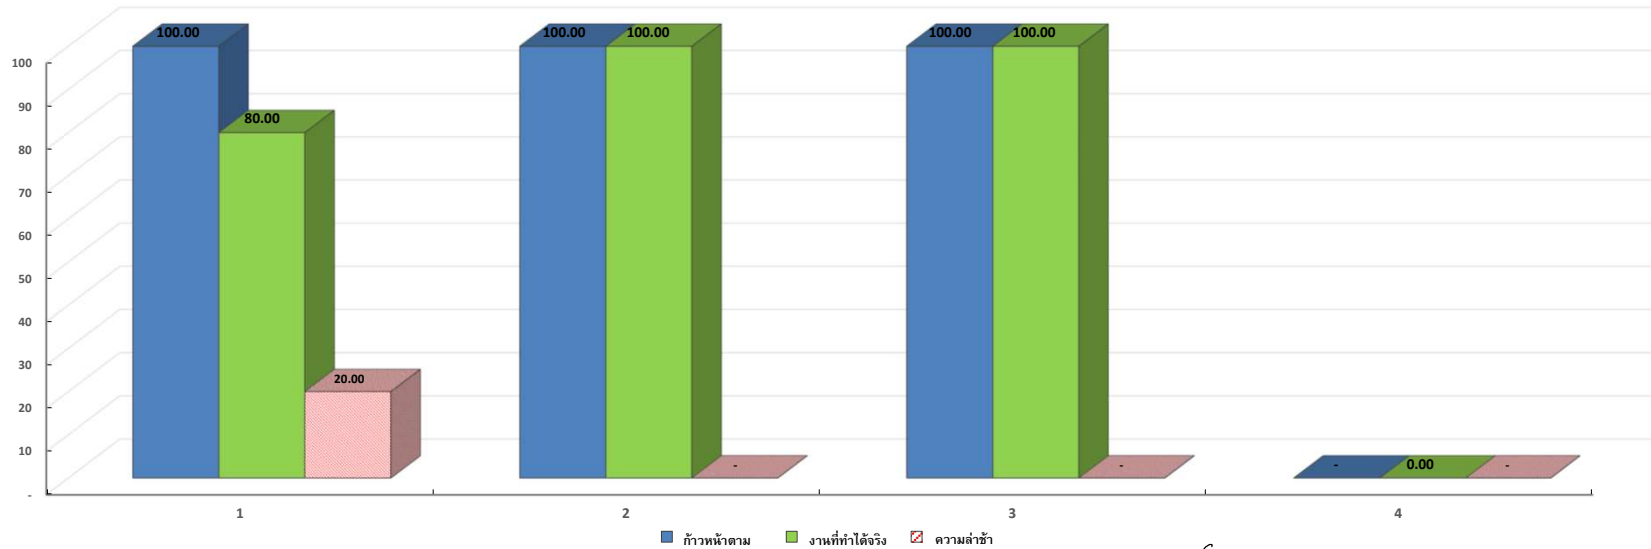

หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ผู้รายงาน

Sw
(นายศิวเรศ ชมภู)
วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจสอบ

zhu
(นายประกายแก้ว บุตราช)
วิศวกรไฟฟ้า รักษาราชการแทน
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
