




สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สัญญาเลขที่	ลงวันที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	งบประมาณ (บาท)	ค่าเงินบาท (ล้านบาท)	เหลือเงิน (ล้านบาท)	ก้าวหน้า (%)	ก้าวหน้าจริง (%)	ความก้าวหน้าเทียบกับแผน (%)	ช้า (%)	คาดว่าจะเสร็จ	หมายเหตุ
งบแผ่นดิน															
1	ก่อสร้างเพื่อบริหารจัดการระบบภายในมหาวิทยาลัย	22/2564	24/5/2564	1/6/2564	27/3/2565	300	24,950,000	303 -	3	100.00	87.00	-	13.00	30 เม.ย. 65	
2	ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 7	5/2565	15/10/2564	26/10/2564	24/3/2565	150	1,736,000	156 -	6	100.00	62.00	-	38.00		
3	ก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานและห้องคำนำสวด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	7/2565	15/10/2564	20/10/2564	16/2/2565	120	1,096,000	162 -	42	100.00	77.00	-	23.00		ส่งงานเรียบร้อยแล้ว
4	ก่อสร้างอาคารกิจกรรมและโรงจอดรถอาคารศูนย์วิจัยและศูนย์	2/2565	19/10/2564	26/10/2564	22/2/2565	120	769,000	156 -	36	100.00	100.00	-	-		ยังไม่เริ่มดำเนินการ
5	จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 13	25/2565	28/3/2565	4/4/2565	30/9/2565	180	2,488,000	0	180	-	0.00	-	-		
6	ปรับปรุงห้องเก็บน้ำดื่ม เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา	11/2565	29/10/2564	17/1/2565	16/5/2565	120	1,475,000	73	47	60.83	5.00	-	55.83		
7	ก่อสร้างขยายห้องเรียนประถมศึกษา โครงการขยายห้องเรียน	9/2565	1/11/2564	1/12/2564	27/8/2565	270	8,080,000	120	150	44.44	12.00	-	32.44		
8	ปรับปรุงห้องประชุมสัณยศาสตร์	3/2565	8/11/2564	15/11/2564	13/4/2565	150	1,488,000	136	14	90.67	66.00	-	24.67		
9	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	8/2565	15/1/2565	6/1/2565	1/11/2565	300	17,154,000	84	216	28.00	4.00	-	24.00		
10	ก่อสร้างถนนและลานจอดรถบริเวณอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม	19/2564	20/2564	17/1/2565	16/5/2565	120	3,344,000	73	47	60.83	42.00	-	18.83		
11	ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการเรียนรวมทางเทคนิคการสัตวศาสตร์	15/2565	31/1/2565	7/2/2565	6/6/2565	120	1,330,000	52	68	43.33	10.00	-	33.33		
12	ปรับปรุงสนามฟุตบอล	17/2565	21/1/2565	28/1/2565	27/4/2565	90	1,111,111	62	28	68.89	6.00	-	62.89		
13	ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมคนพิการ	20/2565	14/2/2565	28/2/2565	27/6/2565	120	1,374,000	31	89	25.83	4.00	-	21.83		
14	ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1	26/2565	25/3/2565	1/4/2565	29/6/2565	90	730,000	0	90	-	0.00	-	-		ยังไม่เริ่มดำเนินการ
15	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คณะวิทยาศาสตร์การจัดการ	14/2565	28/3/2565	1/4/2565	26/11/2565	240	7,500,000	0	240	-	0.00	-	-		ยังไม่เริ่มดำเนินการ
16	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	22/2565	1/3/2565	9/3/2565	6/7/2565	120	777,777	22	98	18.33	5.00	-	13.33		
17	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยในอาคาร 1	24/2565	1/4/2565	1/4/2565	29/7/2565	120	1,798,000	0	120	-	0.00	-	-		ยังไม่เริ่มดำเนินการ

งบประมาณรวมทั้งหมด 77,200,888 บาท

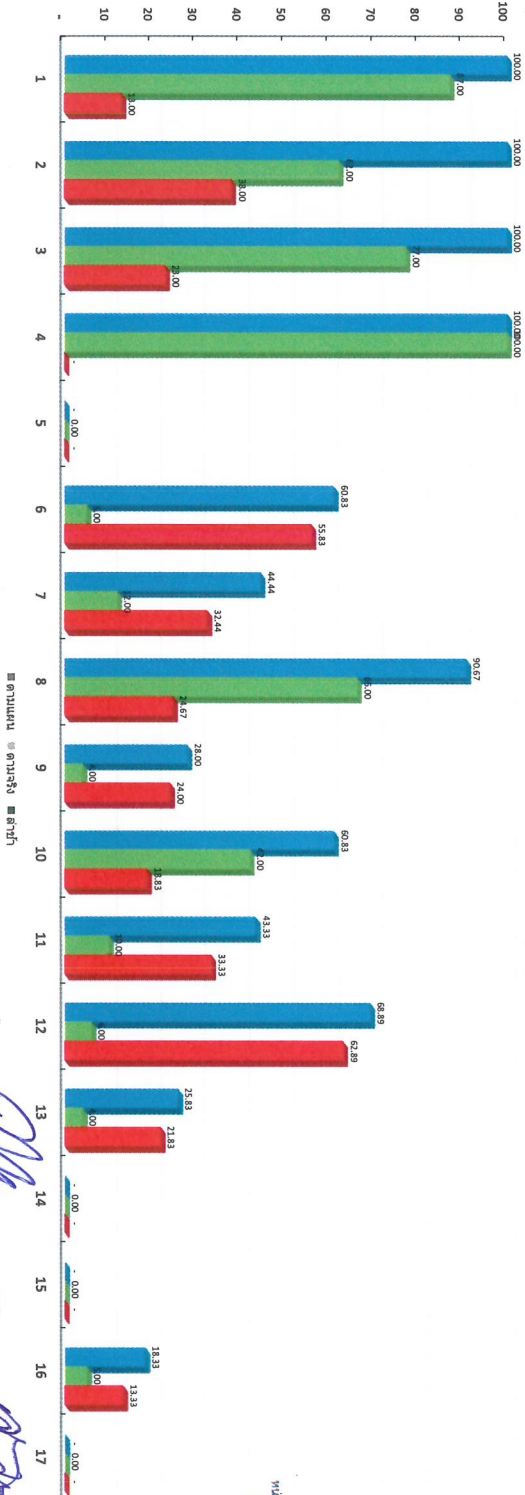

หน่วยงานแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
ผู้อำนวยการสำนักและงานพิเศษ

สรุป ณ วันที่
31/3/2565

ผู้รายงาน

(นายทรงฤทธิ์ พุทธลา)

ผู้ตรวจสอบ

(นายวิชา โทสินา)

หัวหน้าหน่วยงานแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
